

團體名稱：社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會

活動名稱：【街貓安養中心】勸募活動成果報告

表報名稱：服務成果報告

一、說明：

從有到無，是種感動。

購地計劃看起來是遙不可及的夢想，但 103 年終於能以極其優惠價格，購得理想建地。並委託北部貓屋修繕工程公司進行土地內建物結構加強、水電設施等規劃。

除了購地工程建設進行外，為疏解北部貓屋擁擠現象、提供安置貓咪更寬廣空間，於 104 年 11 月中旬租賃 60 餘坪房屋，進行裝潢整修，將其中 48 隻貓咪遷徙至新的空間。

二、苗栗安養中心建設報告--

1. 已興建完成 2 座 1 坪內小木屋於庭院，供貓咪遮風蔽雨。
2. 原有建物三合院一樓、二樓進行牆面工程施工、地板重鋪、樓梯更換、防水處理、廚房整建。
3. 興建前後原山坡防土牆
4. 原有建物倉庫部份加建玻璃隔間、加強四周穩固工程、地板鋪設、門窗修繕。
5. 庭院四周進行圍籬工程，防止貓咪走失。

三、台北市新租賃之安養中心建設報告---

1. 已完成隔間工程
2. 已完成前後陽台圍網工程
3. 104 年 11 月底貓咪已遷入 48 隻、另 30 隻安置於舊址、5 隻安置於辦公室

四、苗栗安養中心工程進度---

1. 預計 105 年 4 月底前完成室內貓傢俱木工建設
2. 預計 105 年 6 月底前完成前院貓咪戶外遊憩設施
3. 預計 105 年 8 月底前完成前院貓咪戶外遊憩設施
4. 並視經費增加電器用品與加裝暖氣設備供貓咪禦寒
5. 於 105 年 4 月進行在地員工招募

五、開始收容貓咪入園日期：

預計 105 年 5 月份，天氣穩定後，先將北部貓屋健康貓咪遷徙至苗栗，不健康需常常就醫貓咪、或是待送養貓咪，則仍安置於台北市安養中心

六、104 年服務貓隻數：120 隻左右，順利送養 31 隻。

目前台北市安養中心安置貓咪為 85 隻，其中超過 30 隻為各地收容所領出之傷病貓。

七、展望未來--

105 年 8 月待苗栗安養中心建設完工，估計可再收容各地無法原放街貓 50-70 隻左右。

經費來源除一般捐款贊助外，已透過全體會員開會同意，將再申請【安養中心】街貓照護基金，進行維護與運作經費勸募。

八、圖片說明--

1. 苗栗安養中心工程初期狀況



苗栗安養中心工程初期狀況



苗栗安養中心工程初期狀況




苗栗



苗栗安養中心工程

2. 苗栗安養中心工程中期狀況

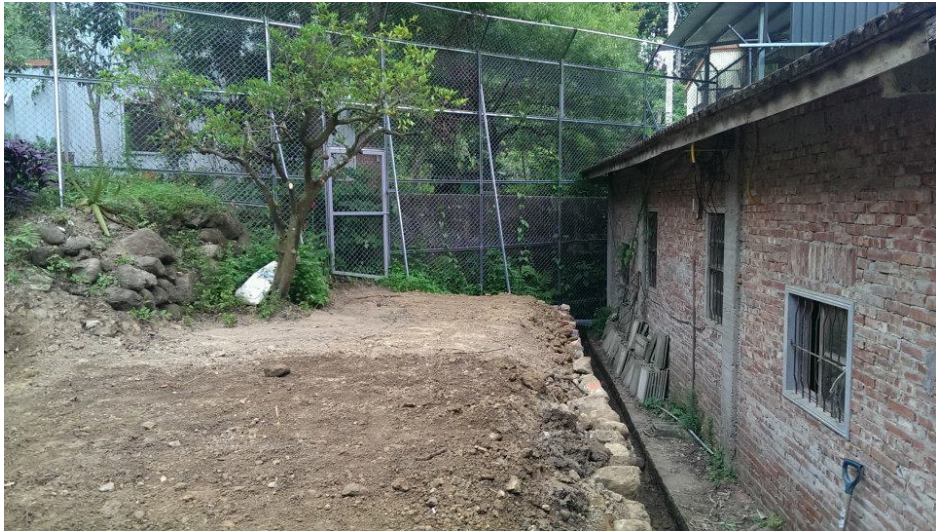

苗栗安養中心工程中期狀況



苗栗安養中心工程中期狀況

